

# REINGENIERÍA DE LAS CERTIFICACIONES DE OBRA: CERTIFICACIÓN ORDINARIA, MEDICIÓN GENERAL CERTIFICACIÓN FINAL, LIQUIDACIÓN



Seminario Web Reingeniería de las Certificaciones de Obra: Certificación Ordinaria, Medición General, Certificación Final, Liquidación.

# Índice del seminario


- 1.- Tramitación Administrativa, Económica y Técnica de las Certificaciones de Obra. Dirección Facultativa Externa y Dirección Facultativa Interna; Ejecución Centralizada y Descentralizada.
- 2.- Reingeniería de Certificaciones:
  - 2.1.-Refactorización del árbol de tramitación.
  - 2.2.-Formularios y Modelos de certificación.
  - 2.3.-Tareas Presupuestarias y Acciones contables.
- 3.- Nuevo tratamiento en las revisiones de precios (Estimación anual; Revisión excepcional de Obras; Valores Negativos en la Revisión de Precios).
- 4.- Ejecución anticipada y Superación del 10% de excesos de mediciones.
- 5.- Gestión del cambio. Certificaciones en tramitación y Comunicación a Direcciones Facultativas Externas.
- 6.- Ruegos y Preguntas.

# 1.- Tramitación Administrativa, Económica y Técnica de las Certificaciones de Obra. (Datos anualidad 2025).


Datos Anualidad 2025 Plataforma Duero:

D.F Externa/D. F Interna.



# 1.1 TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA CERTIFICACIÓN ORDINARIA DE OBRAS

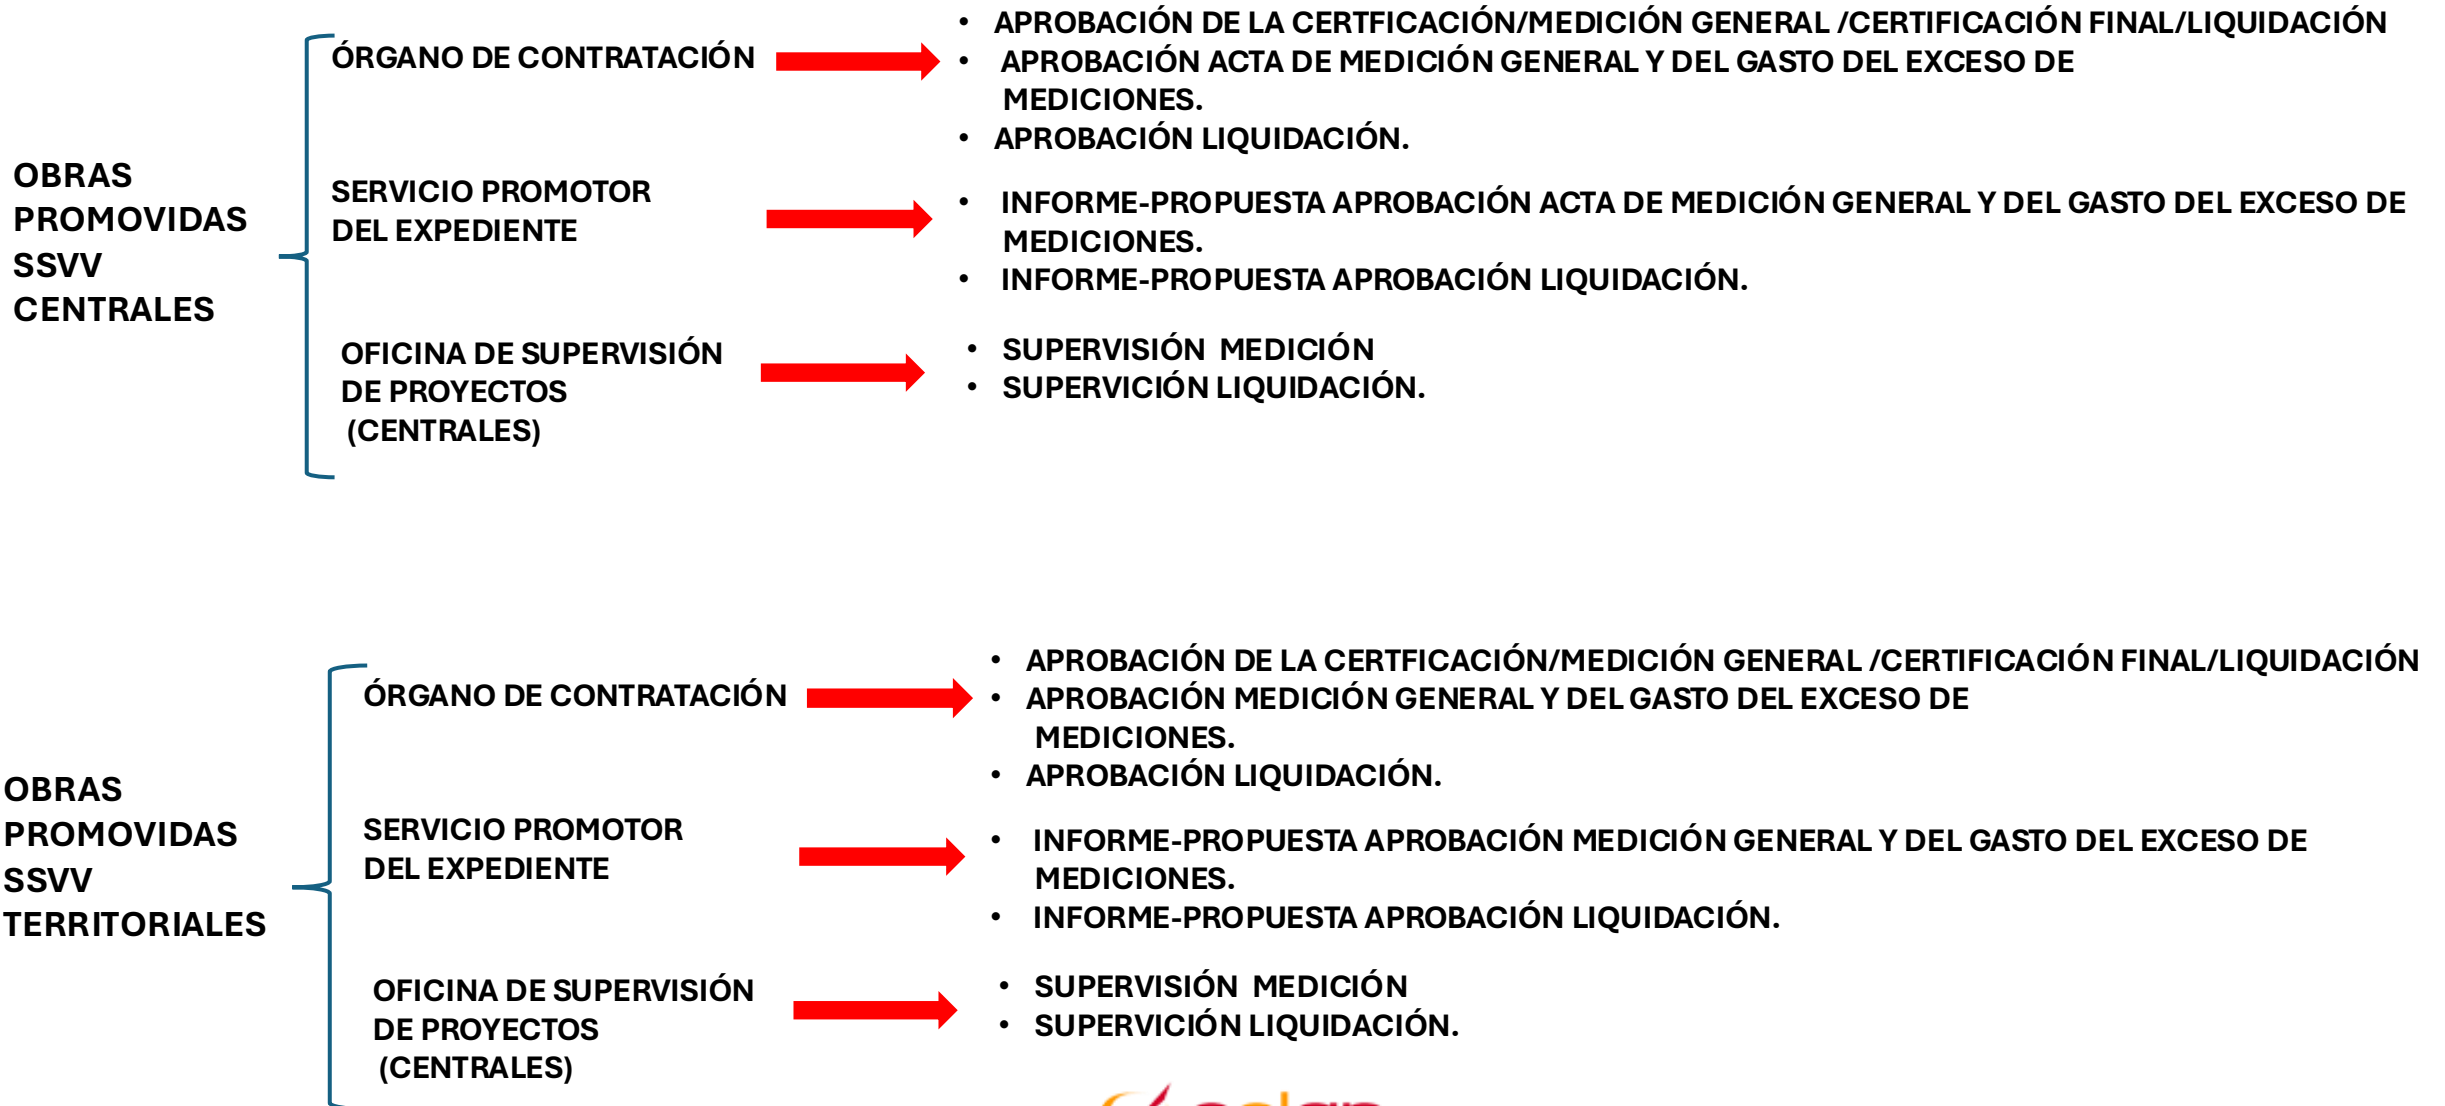

## 1.2 TRAMITACIÓN ECONÓMICA CERTIFICACIÓN ORDINARIA DE OBRAS

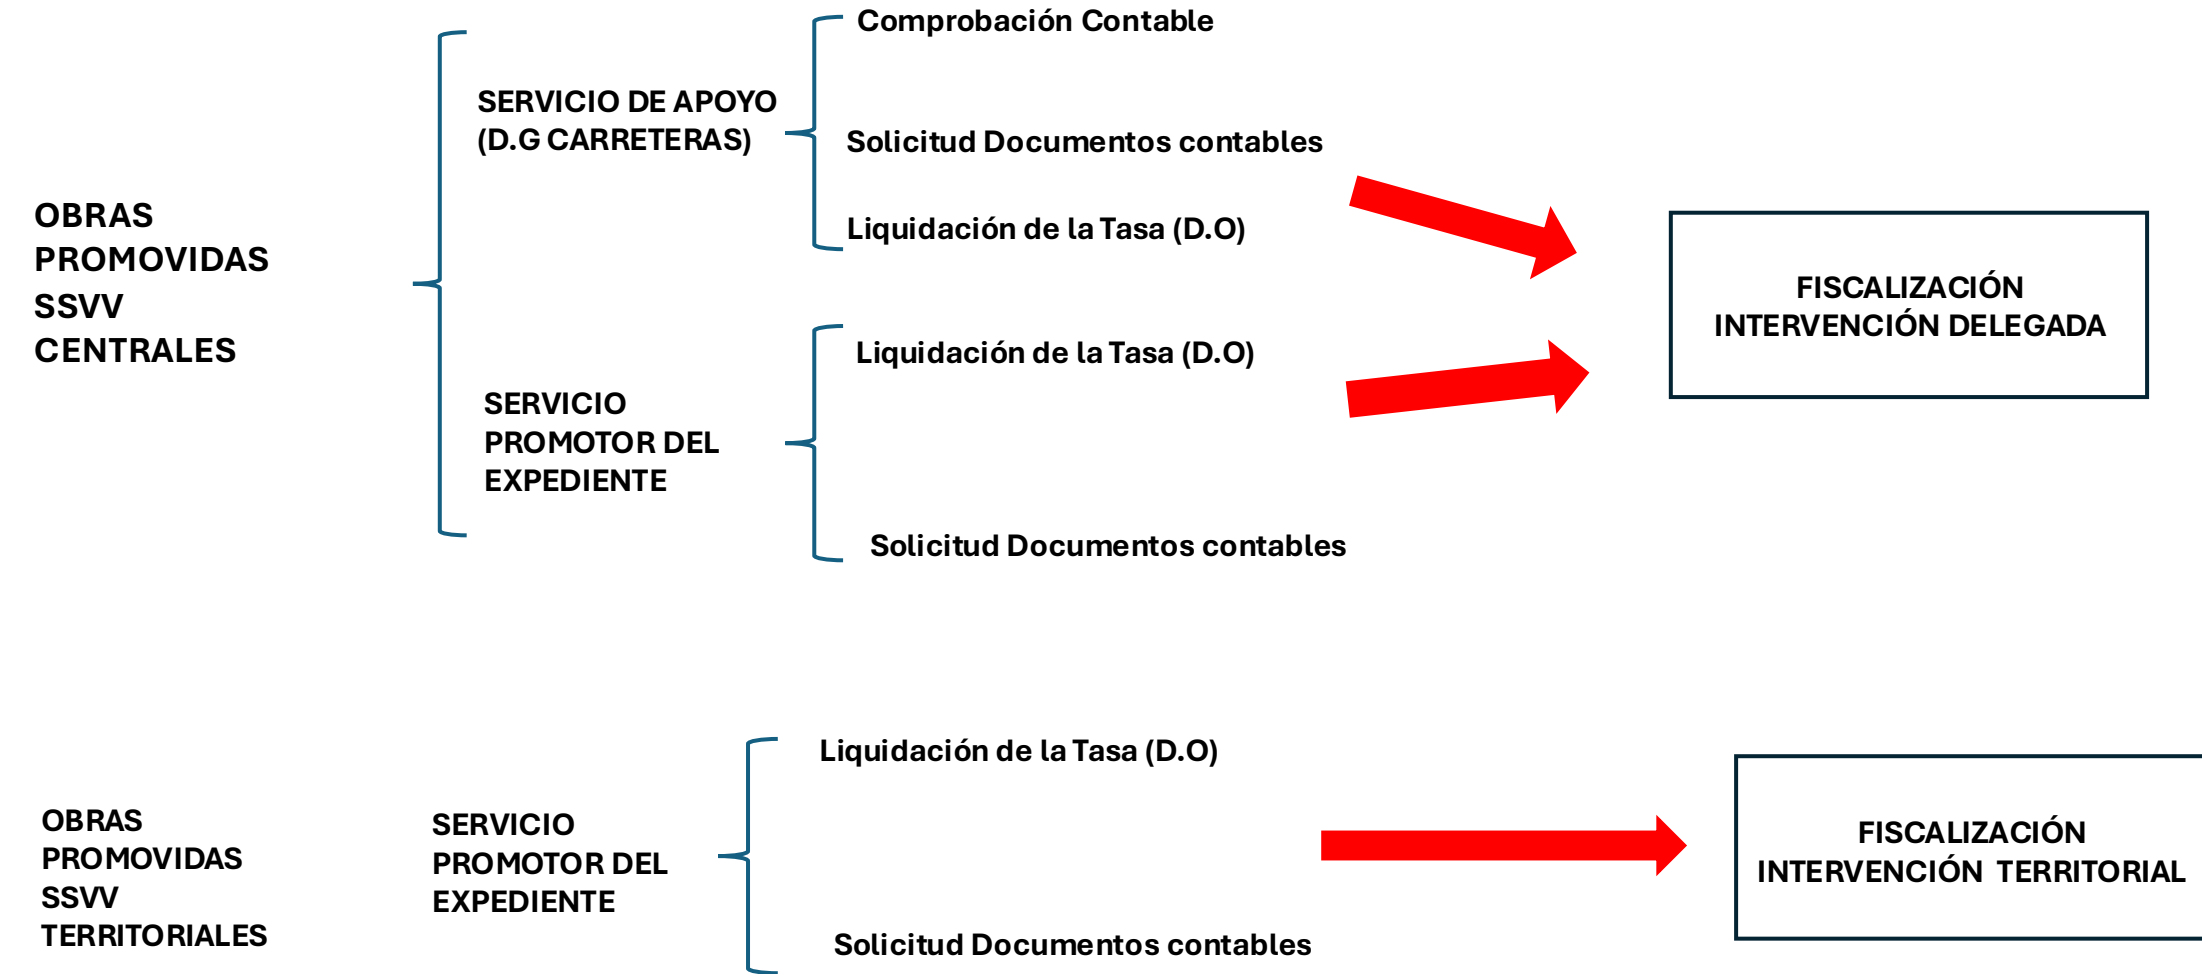

# 1.3 TRAMITACIÓN TÉCNICA CERTIFICACIÓN ORDINARIA DE OBRAS

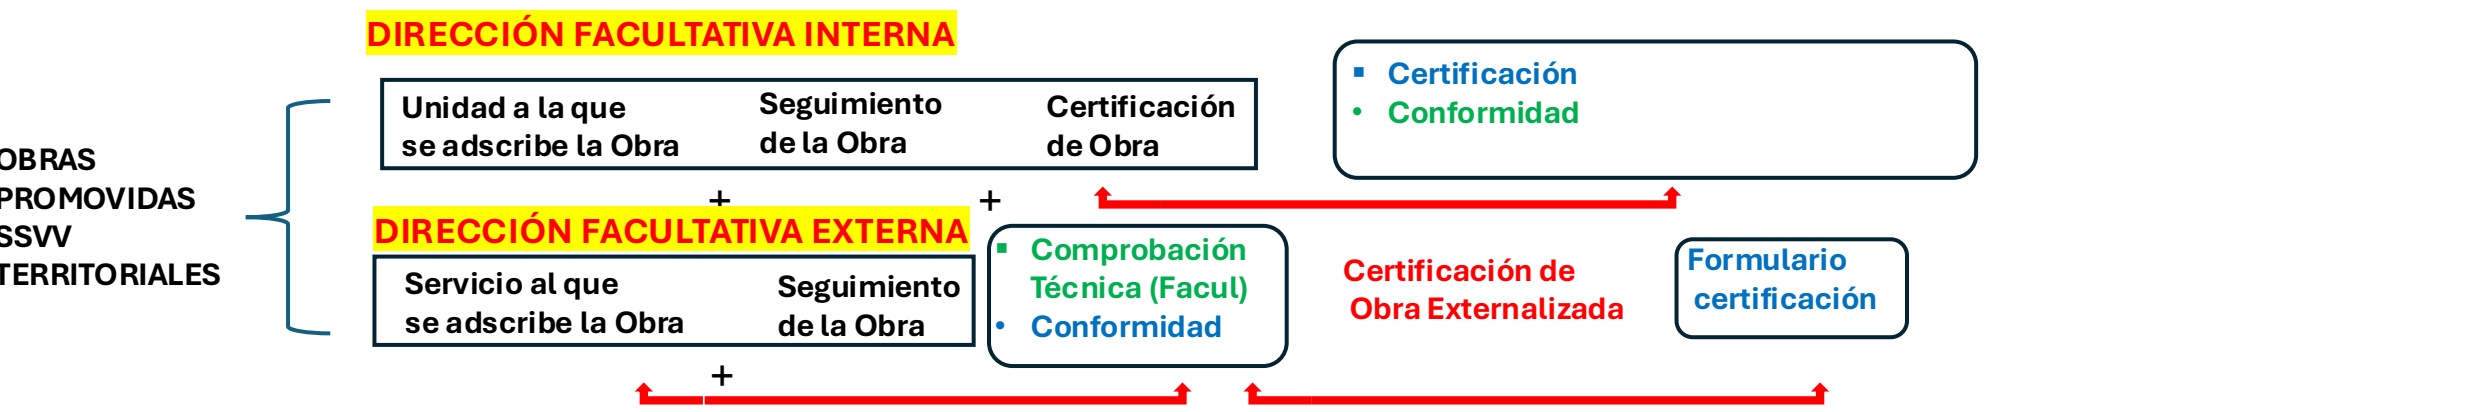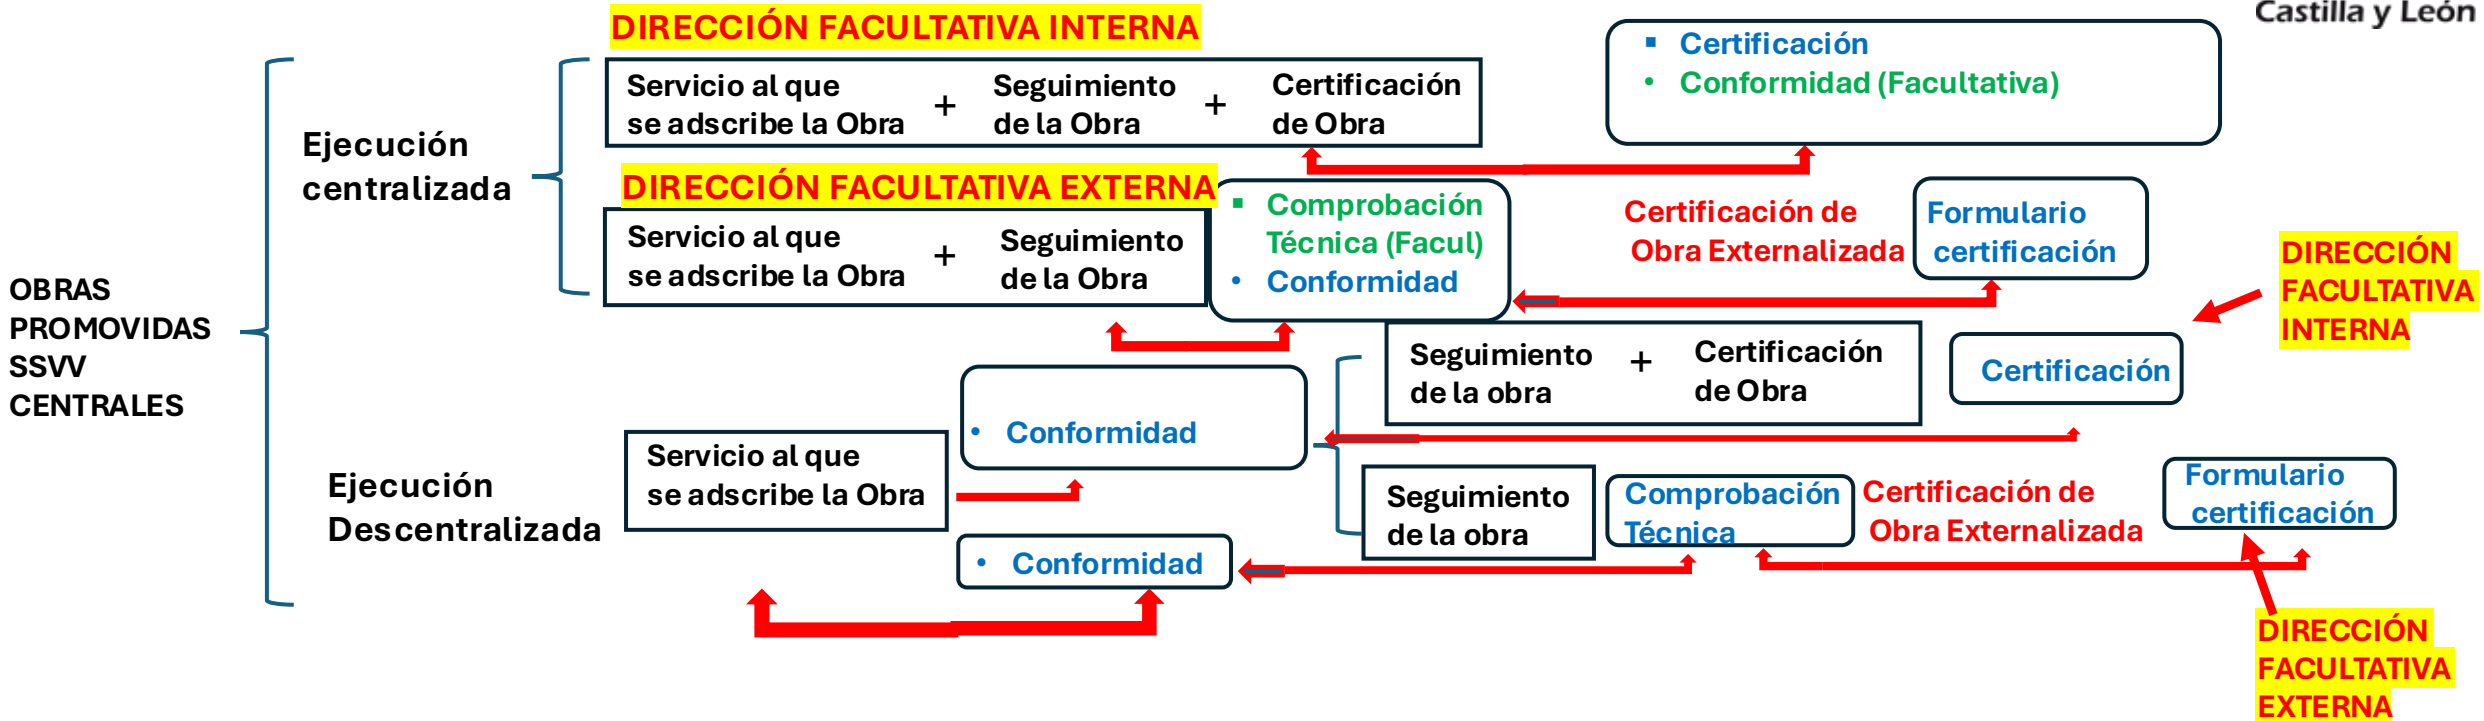

## 1.4 DATOS CERTIFICACIONES DE OBRAS 2025 POR TIPO DE DIRECCIÓN FACULTATIVA.

<b>CERTIFICACIONES</b>	<b>2025</b>	<b>PORCENTAJE</b>
<b>Certificaciones con DFAC externa</b>	948	30,46%
<b>Certificaciones con DFAC interna</b>	2.164	69,54%
<b>TOTAL</b>	<b>3.112</b>	<b>100,00%</b>

## 2.- REINGENIERÍA DE CERTIFICACIONES.















2.1.- Refactorización del árbol de tramitación.

2.2.- Formularios y Modelos de certificación.














2.3.-Tareas Presupuestarias y Acciones contables.

## 2.1.1- REFACTORIZACIÓN DEL ÁRBOL DE CERTIFICACIONES ORDINARIAS SIN EJECUCIÓN DESCENTRALIZADA D.F INTERNA/D.F EXTERNA.

### DIRECCIÓN FACULTATIVA INTERNA


- ▼  A2026/000417-001(CER0002)
- ▼  Datos certificación ordinaria / anticipada
  -  Anexo - Informe de seguimiento de la obra.pdf
  -  Anexo - Acta de Medición.pdf
  -  Anexo - Relación Valorada.pdf
  -  Formulario - 20265550008687.pdf
  -  Certificación Ordinaria/Anticipada/Rev. Precios
  -  Comprobación técnica Cert. Ordinaria/Anticipada/Rev. de precios
  -  Conformidad Certificación Ordinaria/Anticipada/Rev. Precios
  -  Comprobación contable Cert. Ordinaria/Anticipada/Rev. de precios
  -  Tasa DFAC Cert. Ordinaria/Anticipada/Revisión de precios
  -  Datos intervención de la certificación ordinaria
  -  Intervención Cert. Ordinaria/Anticipada/Revisión de precios
  -  Aprobación Cert. Ordinaria/Anticipada/Revisión de precios

### DIRECCIÓN FACULTATIVA EXTERNA


- ▼  A2026/000417-001(CER0002)
- ▼  Datos certificación ordinaria / anticipada
  -  Anexo - Informe de seguimiento de la obra.pdf
  -  Anexo - Acta de Medición.pdf
  -  Anexo - Relación Valorada.pdf
  -  Formulario - 20265550008687.pdf
  -  Comprobación técnica Cert. Ordinaria/Anticipada/Rev. de precios
  -  Conformidad Certificación Ordinaria/Anticipada/Rev. Precios
  -  Comprobación contable Cert. Ordinaria/Anticipada/Rev. de precic
  -  Tasa DFAC Cert. Ordinaria/Anticipada/Revisión de precios
  -  Datos intervención de la certificación ordinaria
  -  Intervención Cert. Ordinaria/Anticipada/Revisión de precios
  -  Aprobación Cert. Ordinaria/Anticipada/Revisión de precios

## 2.1.2- REFACTORIZACIÓN DEL ÁRBOL DE CERTIFICACIONES ORDINARIAS CON EJECUCIÓN DESCENTRALIZADA EN SERVICIOS TERRITORIALES. D.F INTERNA/D.F EXTERNA

### DIRECCIÓN FACULTATIVA INTERNA

- ✓  A2026/000417-001(CER0002)
- ✓  Datos certificación ordinaria / anticipada
  - Anexo - Informe de seguimiento de la obra.pdf
  - Anexo - Acta de Medición.pdf
  - Anexo - Relación Valorada.pdf
  - Formulario - 20265550008687.pdf
  - Certificación Ordinaria/Anticipada/Rev. Precios
  - Comprobación técnica Cert. Ordinaria/Anticipada/Rev. de precios
  - Conformidad Certificación Ordinaria/Anticipada/Rev. Precios
  - Comprobación contable Cert. Ordinaria/Anticipada/Rev. de precios
  - Tasa DFAC Cert. Ordinaria/Anticipada/Revisión de precios
  - Datos intervención de la certificación ordinaria
  - Intervención Cert. Ordinaria/Anticipada/Revisión de precios
  - Aprobación Cert. Ordinaria/Anticipada/Revisión de precios

### DIRECCIÓN FACULTATIVA EXTERNA

- ✓  A2026/000417-001(CER0002)
- ✓  Datos certificación ordinaria / anticipada
  - Anexo - Informe de seguimiento de la obra.pdf
  - Anexo - Acta de Medición.pdf
  - Anexo - Relación Valorada.pdf
  - Formulario - 20265550008687.pdf
  - Comprobación técnica Cert. Ordinaria/Anticipada/Rev. de precios
  - Conformidad Certificación Ordinaria/Anticipada/Rev. Precios
  - Comprobación contable Cert. Ordinaria/Anticipada/Rev. de precios
  - Tasa DFAC Cert. Ordinaria/Anticipada/Revisión de precios
  - Datos intervención de la certificación ordinaria
  - Intervención Cert. Ordinaria/Anticipada/Revisión de precios
  - Aprobación Cert. Ordinaria/Anticipada/Revisión de precios

## 2.2.1 NUEVOS FORMULARIOS DE CERTIFICACIÓN DE OBRAS.

SEDE ELECTRÓNICA

TRÁMITES Y  
SERVICIOS

SOBRE LA SEDE


AYUDA SOBRE  
ADMINISTRACIÓN  
ELECTRÓNICA


INFORMACIÓN DE  
INTERÉS


SERVICIO 012


SEDE ELECTRÓNICA  
*de Castilla y León*


### Tramitación electrónica

 Solicitud de trámites del procedimiento de contratación administrativa

 Solicitud de alta/modificación de datos de empresa

 [Certificación de obras](#)

 Declaración Responsable Publicidad Institucional

 Recursos

### CERTIFICACIONES DE OBRA

Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de mejora de es Servicio de Atención al Ciudadano 012 (983 327 850 desde fuera de Castilla y León).

### SELECCIONE EL TIPO DE CERTIFICACIÓN QUE DESEA PRESENTAR

\* Tipo:

- Seleccione por favor:
- Seleccione por favor:
  - CERTIFICACIÓN ORDINARIA/ANTICIPADA
  - CERTIFICACIÓN DE REVISIÓN DE PRECIOS
  - MEDICIÓN GENERAL
  - CERTIFICACIÓN FINAL
  - LIQUIDACIÓN

## 2.2.2 FORMULARIO ACTUAL DE CERTIFICACIÓN ORDINARIA DE OBRAS (DATOS)

\* Última certificación con este modelo la correspondiente a abril de 2026.

### - DATOS DE LA CERTIFICACIÓN

	Importe (sin IVA)	Importe (con IVA)
<b>1.- OBRA ACREDITADA Y CERTIFICADA MENSUAL</b>	0,00 €	0,00 €
1.1.- Obra acreditada sin revisión de precios mensual	0,00 €	0,00 €
Obra ejecutada y acreditada mensual	0,00 €	0,00 €
Abonos de instalaciones, equipo y materiales	0,00 €	0,00 €
Devolución de aval <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No		
Anticipos a cuenta de maquinaria	0,00 €	0,00 €
Devolución de aval <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No		
1.2.- Importe de revisión de precios mensual	0,00 €	0,00 €
Importe de obra revisable	0,00 €	
Coeficiente de revisión del mes	0,00000000	
1.3.- Importe de revisión excepcional de precios	0,00 €	0,00 €
Importe de obra revisable	0,00 €	
Coeficiente de revisión	0,00000000	
<b>2.- OBRA NO ACREDITADA MENSUAL</b>	0,00 €	0,00 €
Porcentaje exceso medición presupuesto vigente líquido	0,00000000	
<b>TOTAL OBRA EJECUTADA MENSUAL</b>	0,00 €	0,00 €

## 2.2.3 NUEVO FORMULARIO CERTIFICACIÓN ORDINARIA DE OBRAS (DATOS DE CERTIFICACIÓN)

\* Puesta en producción a partir de junio de 2026 para certificación de mayo.

### ▼ DATOS DE LA CERTIFICACIÓN

	Importe (sin IVA)	Importe (con IVA)
<b>1.- OBRA EJECUTADA QUE SE ACREDITA EN ESTA CERTIFICACIÓN</b>	0,00 €	0,00 €
1.1.- Obra ejecutada y acreditada sin revisión de precios en esta certificación	0,00 €	0,00 €
1.2.- Importe de revisión de precios en esta certificación	0,00 €	0,00 €
Importe de obra revisable	0,00 €	
Coefficiente de revisión en esta certificación	0,00000000	
<b>2.- OBRA EJECUTADA COMO EXCESO DE MEDICIÓN QUE NO SE ACREDITA</b>	0,00 €	0,00 €
2.1.- Obra ejecutada como exceso de medición que no se acredita	0,00 €	0,00 €
<b>3.- OBRA EJECUTADA QUE NO ACREDITADA EN ESTA CERTIFICACIÓN</b>	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL OBRA EJECUTADA EN ESTA CERTIFICACIÓN</b>	0,00 €	0,00 €

## 2.2.4 NUEVO FORMULARIO CERTIFICACIÓN ORDINARIA DE OBRAS (DATOS DE IMPORTE LÍQUIDO QUE SE ACREDITA) \* Puesta en producción a partir de junio de 2026 para certificación de mayo.

### IMPORTE LÍQUIDO QUE SE ACREDITA EN ESTA CERTIFICACIÓN

	Importe (sin IVA)	Importe (con IVA)
Obra ejecutada y que se acredita en esta certificación	0,00 €	0,00 €
Obra ejecutada con anterioridad y que se acredita en esta certificación	0,00 €	0,00 €
Importe de revisión de precios	0,00 €	0,00 €
Abonos de instalaciones, equipo y materiales	0,00 €	0,00 €
Devolución de aval <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No		
Anticipos a cuenta de maquinaria	0,00 €	0,00 €
Devolución de aval <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No		
<b>TOTAL IMPORTE LÍQUIDO QUE SE ACREDITA EN ESTA CERTIFICACIÓN</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## 2.2.5 CONTENIDO DEL FORMULARIO CERTIFICACIÓN ORDINARIA DE OBRAS QUE NO EXPERIMENTA CAMBIO.

### ▼ PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE ESTA CERTIFICACIÓN SIN LA BAJA DE ADJUDICACIÓN

Se corresponde con el importe de la obra ejecutada en esta certificación (no a origen), actualizado en su caso con la revisión de precios, excluido los gastos generales, el beneficio industrial y el IVA.

### ▼ CERTIFICO

\* 1. Que el importe de las Obras ejecutadas en el periodo a que corresponde esta certificación asciende a la cantidad de

\* 2. Que el importe que se acredita al adjudicatario es de

3. Que se cumplen, si ha lugar, los requisitos previstos en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

### ▼ CENTRO O UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA QUE SE DIRIGE

\* Consejería / Organismo autónomo / Ente público de derecho privado / Delegación Territorial:



*\* Los Entes Públicos de Derecho Privado, salvo el ITACYL no pueden exigir tasa de dirección e inspección de obras.*

## 2.2.6.-PANTALLA DUERO CERTIFICACIÓN ORDINARIA DE OBRAS (DATOS)

### Datos de la certificación

#### Obra que se acredita en esta certificación

Obra ejecutada y acreditada sin revisión (sin IVA)	<input type="text" value="0,00"/>	Obra ejecutada y acreditada sin revisión	<input type="text" value="0,00"/>
Importe de revisión de precios (sin IVA)	<input type="text" value="0,00"/>	Importe de revisión de precios	<input type="text" value="0,00"/>
Importe de obra revisable:	<input type="text" value="0,00"/>		
Coefficiente de revisión:	<input type="text" value="0,00000000"/>		
<b>Total obra que se acredita (sin IVA)</b>	<input type="text" value="0,00"/>	<b>Total obra que se acredita</b>	<input type="text" value="0,00"/>

#### Obra ejecutada como exceso de medición que no se acredita

Obra ejecutada como exceso de medición que no se acredita (sin IVA)	<input type="text" value="0,00"/>	Obra ejecutada como exceso de medición que no se acredita	<input type="text" value="0,00"/>
Porcentaje a origen sobre presupuesto vigente líquido	: <input type="text" value="0,00000000"/>		

← *Campo auto-calculado por Duero*

#### Obra que no se acredita

Obra ejecutada que no se acredita (sin IVA)	<input type="text" value="0,00"/>	Obra ejecutada que no se acredita	<input type="text" value="0,00"/>
<b>Total obra ejecutada (sin IVA)</b>	<input type="text" value="0,00"/>	<b>Total obra ejecutada</b>	<input type="text" value="0,00"/>

## 2.2.7 PANTALLA DUERO CERTIFICACIÓN ORDINARIA DE OBRAS (IMPORTE LÍQUIDO Y TASA)

### Importe líquido que se acredita en esta certificación

Obra ejecutada y acreditada sin  
revisión (sin IVA) :

Obra ejecutada y acreditada sin  
revisión :

Obra acreditada ejecutada con  
anterioridad (sin IVA) :

Obra acreditada ejecutada con  
anterioridad :

Importe de revisión de precios (sin  
IVA) :

Importe de revisión de precios:

Abonos de instalaciones, equipo y  
materiales (sin IVA) :

Abonos de instalaciones, equipo y  
materiales :

Anticipos a cuenta de maquinaria (sin  
IVA) :

Anticipos a cuenta de maquinaria:

**Total importe líquido que se  
acredita (sin IVA) :**


**Total importe líquido que se  
acredita :**

### Tasa de dirección e inspección de obra

Presupuesto de ejecución material:

Importe tasa de dirección e inspección:  
de obra :

## 2.3.1 TRAMITACIÓN CONTABLE DE LAS CERTIFICACIONES ORDINARIAS

- ▼  A2026/000417-001(CER0003)
  - ▼ ● Datos certificación ordinaria / anticipada
    - Anexo - Relación Valorada.pdf
    - Anexo - Acta de Medición.pdf
    - Anexo - Informe de seguimiento de la obra.pdf
    - Datos detalles presupuestarios - Revisión de precios
    - Datos RC complementario - Revisión de precios
    - Formulario - 20265550008712.pdf
    - Comprobación técnica Cert. Ordinaria/Anticipada/Rev. de precios
    - Conformidad Certificación Ordinaria/Anticipada/Rev. Precios
    - Comprobación contable Cert. Ordinaria/Anticipada/Rev. de precios
    - Tasa DFAC Cert. Ordinaria/Anticipada/Revisión de precios
    - Datos intervención de la certificación ordinaria
    - Intervención Cert. Ordinaria/Anticipada/Revisión de precios
    - Aprobación Cert. Ordinaria/Anticipada/Revisión de precios
    - Factura contratista - certificación ordinaria/anticipada
    - Datos OK - certificación ordinaria/anticipada
    - Datos ADOK - Revisión de precios

**REVISIÓN  
DE PRECIOS**

## 2.3.2 TRAMITACIÓN CONTABLE DE LAS CERTIFICACIONES FINALES

▼ A2026/000415-001(CEF0001)

### MEDICIÓN GENERAL

- > Medición general
- > Certificación final

▼ A2026/000415-001(CEF0001)

- ▼ Medición general
  - ▼ Inicio
    - ▼ Datos medición general
      - 6.- Relación Valorada
      - Acta de Medición General
      - Borrador de Certificación Final
      - Informe supervisión de acta medición general
      - Datos detalles presupuestarios - medición general**
      - Inf. propuesta aprob. acta de medición y gasto - medición gral
  - ▼ Fiscalización
    - Datos fiscalización previa - Gestor - medición general
    - ▼ Datos fiscalización previa - Intervención - medición general
      - Informe fiscalización acta de medición - medición general
  - ▼ Resolución
    - Orden/Resol. aprob. acta de medición y gasto - medición gral.
    - Notif. contratista orden/resol. acta medición - medición general

### CERTIFICACION FINAL

▼ A2026/000415-001(CEF0001)

- ▼ Certificación final
  - Certificación Final
  - Conformidad Certificación Final
  - ⊗ Comprobación contable Certificación Final
  - Tasa DFAC de la Certificación Final
  - Datos intervención de la certificación final
  - Intervención de la Certificación Final
  - Aprobación de la Certificación Final
  - Factura contratista - cert. Final
  - Datos ADOK certificación final**
  - Datos OK - certificación final**

### 3.- NUEVO TRATAMIENTO EN LAS REVISIONES DE PRECIOS

- REVISIÓN EN ESTIMACIÓN ANUAL.
- REVISIÓN EXCEPCIONAL DE PRECIOS.

## 3.1 REVISIÓN DE PRECIOS EN ESTIMACIÓN ANUAL

- Hasta la fecha, en a Plataforma Duero se contemplaba el incidente de ejecución de “**Revisión de precios en estimación anual**”.
- Este incidente de ejecución se fundamenta en la previsión del artículo 105.1 del RGLCAP que con el carácter de **NO BÁSICO** dispone que “ *Al objeto de proveer la cobertura financiera necesaria para atender las obligaciones derivadas de los abonos por revisión de precios de los contratos con derecho a ella, se efectuará al comienzo de cada ejercicio económico la oportuna retención de los créditos precisos para atender los mayores gastos que se deriven de la revisión de precios de los contratos en curso de ejecución.*”
- Cuando una certificación de obra, presentada por D.F externa, incluía Revisión de Precios no se creaba automáticamente el subexpediente de certificación hasta que informara el gestor si esa revisión era “*Estimación Anual*” o “*En Ejecución*”.
- Se elimina este incidente de ejecución en el contrato de obras y los registros se asociarán automáticamente por dos razones: 1.- Su escasísimo uso por los gestores de obras. 2.- La no aplicación obligatoria de esta previsión a nuestra Administración por el carácter no básico del precepto.

## 3.2 REVISIÓN EXCEPCIONAL DE PRECIOS EN CONTRATOS DE OBRA

Conforme a la Disposición final trigésima séptima del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo que modifica el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, el régimen excepcional de revisión de precios en los contratos de Obra, a partir de su entrada en vigor el 31/03/2022:

- Los que estén en licitación, adjudicación o formalización a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley.
- Los que el anuncio de **adjudicación o formalización** se publique en PLACSP hasta el 31/03/2023.
- Los que el **anuncio de licitación** se publique en PLACSP hasta el 31/03/2023 y cuyo PCAP establezca una fórmula de revisión de precios.

En la fecha de entrada en producción de los nuevos modelos de certificaciones, no se contempla la Revisión excepcional de Obras. En el caso de que en alguna certificación o en la Medición General y Certificación final de contratos de obras, incluidos en el ámbito del R.D Ley 6/2022, fuera necesaria recoger una revisión excepcional de precios, se consignará en el campo de Revisión de precios del modelo de certificación y se acreditará en la documentación que se adjunta a la certificación.

### 3.3 REVISIÓN DE PRECIOS CON VALORES NEGATIVOS

Código IAPA: n.º 2129 Modelo: n.º: 4548

#### CERTIFICACIÓN ORDINARIA/ANTICIPADA

Número: 2      Mes: Abril      Año: 2026

	Importe (sin IVA)	Importe (con IVA)
<b>1.- OBRA EJECUTADA QUE SE ACREDITA EN ESTA CERTIFICACIÓN</b>	295.000,00 €	356.950,00 €
1.1.- Obra ejecutada y acreditada sin revisión de precios en esta certificación	300.000,00 €	363.000,00 €
<b>1.2.- Importe de revisión de precios en esta certificación</b>	<b>-5.000,00 €</b>	<b>-6.050,00 €</b>
Importe de obra revisable	300.000,00 €	
Coeficiente de revisión en esta certificación	1,25300000	
<b>2.- OBRA EJECUTADA COMO EXCESO DE MEDICIÓN QUE NO SE ACREDITA</b>	0,00 €	0,00 €
2.1.- Obra ejecutada como exceso de medición que no se acredita	0,00 €	0,00 €
Porcentaje a origen sobre el presupuesto vigente líquido	0,00000000	
<b>3.- OBRA EJECUTADA QUE NO ACREDITADA EN ESTA CERTIFICACIÓN</b>	30.000,00 €	36.300,00 €
<b>TOTAL OBRA EJECUTADA EN ESTA CERTIFICACIÓN</b>	<b>325.000,00 €</b>	<b>393.250,00 €</b>

#### IMPORTE LÍQUIDO QUE SE ACREDITA EN ESTA CERTIFICACIÓN

	Importe (sin IVA)	Importe (con IVA)
Obra ejecutada y que se acredita en esta certificación	300.000,00 €	363.000,00 €
Obra ejecutada con anterioridad y que se acredita en esta certificación	0,00 €	0,00 €
Importe de revisión de precios	<b>-5.000,00 €</b>	<b>-6.050,00 €</b>
<b>TOTAL IMPORTE LÍQUIDO QUE SE ACREDITA EN ESTA CERTIFICACIÓN</b>	<b>295.000,00 €</b>	<b>356.950,00 €</b>

## 4.- EJECUCIÓN ANTICIPADA Y SUPERACIÓN 10% DE EXCESOS DE MEDICIONES

- EJECUCIÓN ANTICIPADA.
- SUPERACIÓN 10% DE EXCESOS DE MEDICIONES.
- REVISIÓN DE PRECIOS CON VALORES NEGATIVOS.

## 4.1 EJECUCIÓN ANTICIPADA. REGULACIÓN

**Cláusula 53 Decreto 3854/1970**, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.

*El contratista podrá desarrollar los trabajos con celeridad mayor que la necesaria para ejecutar las obras en el tiempo prefijado en el contrato, salvo que a juicio de la Dirección existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, una cantidad mayor que la consignada en la anualidad correspondiente.*

### **Artículo 152 RGLCAP**

*En las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que rijan en el contrato no se contará el plazo previsto en el artículo 99.4 de la Ley desde la fecha de su expedición, sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y programas de trabajo aprobados deberían producirse.*

### Ejecución de exceso de unidades por encima del 10% de Retención Cautelar.

- **D.F interna:** Al grabar y concluir la pantalla de datos saldrá un Aviso informando que el exceso de mediciones supera el 10% de retención cautelar.
- **D.F Externa:** No permitirá la auto-asociación automática y creación del subexpediente de certificación. Se debe incorporar manualmente por el usuario. Duero lanzará un aviso informando que el exceso de mediciones supera el 10% de retención cautelar.

En ambos casos, en la tarea de fiscalización de la Intervención debe salir un Aviso informando de esta circunstancia.

En ese caso lo normal es que la Intervención lo repare y se tramite como un reconocimiento de obligación.

## 5.- GESTIÓN DEL CAMBIO

- CERTIFICACIONES EN TRAMITACIÓN
- COMUNICACIÓN A DIRECCIONES FACULTATIVAS EXTERNAS

## 5.- HITOS EN LA GESTIÓN DEL CAMBIO.

- El 4 de mayo recordaremos a los gestores de obras el cambio del modelo de certificaciones, quienes a su vez lo comunicarán a los gestores de DDFE externas.
- El 15 de mayo será el último día para la auto-asociación automática de certificaciones de obra por formulario antiguo.
- El 1 de junio se pondrá en producción nuevos formularios en la sede electrónica (no se produciría la auto-asociación y en las instrucciones se indicaría que la certificación de mayo no la pueden gestionar hasta después del transporte a producción el 12 de junio).
- En el caso de las certificaciones de Obra con Dirección Facultativa interna, dado que las nuevas pantallas, para certificar el mes de mayo, no estarán en producción hasta el transporte de 11 de junio, deberán grabarse los datos de la correspondiente a esa certificación a partir de esa fecha.
- El 10 de junio para el caso excepcional de que el documento contable aún no esté contabilizado, pasaremos los flujos de certificación a proceso manual.
- El 11 de junio procederemos al transporte de nueva funcionalidad.

# RUEGOS Y PREGUNTAS

Seminario Web Reingeniería de las Certificaciones de Obra: Certificación Ordinaria, Medición General, Certificación Final, Liquidación.

*¡Gracias!*

Seminario Web Reingeniería de las Certificaciones de Obra: Certificación Ordinaria, Medición General, Certificación Final, Liquidación.
